

中央水利建设投资统计 月报 (二月)

水利部规划计划司

2013年3月5日

2012年累计安排中央水利投资计划1623亿元,纳入月报统计的中央投资1564.5亿元,其中中央预算内投资918.6亿元,主要安排农村饮水安全工程280亿元、大中型病险水库(闸)除险加固25亿、灌区建设与节水改造工程110亿元、重大水利工程503.6亿元;中央财政水利专项资金645.9亿元,主要安排中小河流治理210亿元、小型病险水库除险加固208亿元、小型农田水利建设203.1亿元、水土保持20亿元、农村水电增效扩容改造4.8亿元。

截至2013年2月28日统计:2012年中央投资计划完成率75.5%,与上期相比提高5.5%;与去年同期相比提高9.4%。

一、投资计划下达情况

2012年中央水利建设投资计划已下达到项目单位1534.5亿元,投资计划下达率为98.1%。投资计划尚未全部下达的地区有北京、内蒙古、辽宁、大连、黑龙江、福建、厦门、江西、山东、青岛、广东、重庆、西藏、宁夏、兵团;下达率低于90%

的地区有大连、黑龙江、厦门。


2012 年中央预算内水利投资 918.6 亿元，要求地方配套投资 845.9 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 911.5 亿元、地方配套投资计划 911.8 亿元，投资计划下达率分别为 99.2% 和 107.8%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程中央投资分别下达 279.5 亿元、25.0 亿元、110.0 亿元、497.0 亿元，投资计划下达率分别为 99.8%、100.0%、100.0% 和 98.7%。

2012 年中央财政水利专项资金预算共 645.9 亿元，已分解下达项目单位 623.1 亿元，预算分解下达率为 96.5%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 207.7 亿元、207.6 亿元、184.8 亿元、18.2 亿元和 4.8 亿元，预算分解下达率分别为 98.9%、99.8%、91.0%、90.9% 和 100.0%。

二、资金到位情况


2012 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 860.8 亿元、地方配套投资 710.8 亿元，到位率分别为 93.7% 和 84.0%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 162.3 亿元、7.2 亿元、46.1 亿元、495.2 亿元，到位率分别为 107.1%、55.4%、70.6% 和 80.4%。

图1 2012年中央预算内投资地方配套投资拨付率
(按地区分)

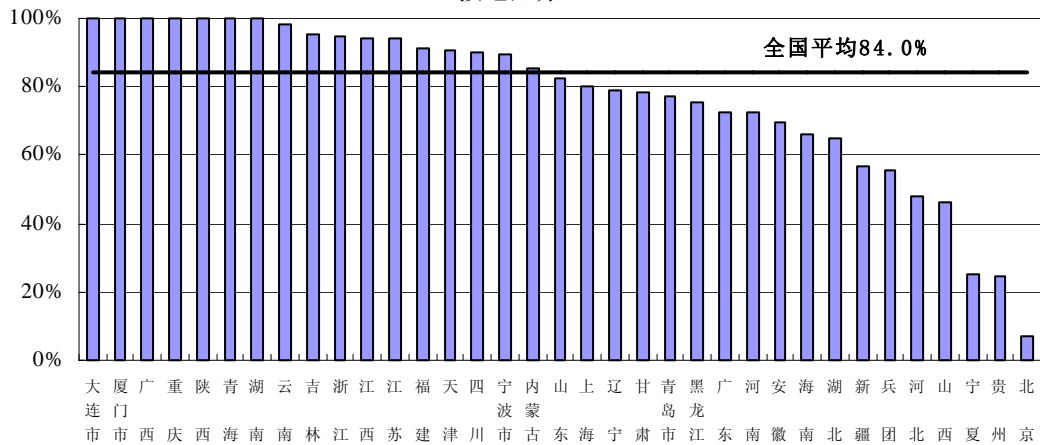

2012 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位中央资金 603.8 亿元、地方配套资金 311.5 亿元，到位率分别为 93.5%和 90.1%（见图 2）。


图2 2012年中央财政水利专项投资计划地方配套投资拨付率
(按地区分)

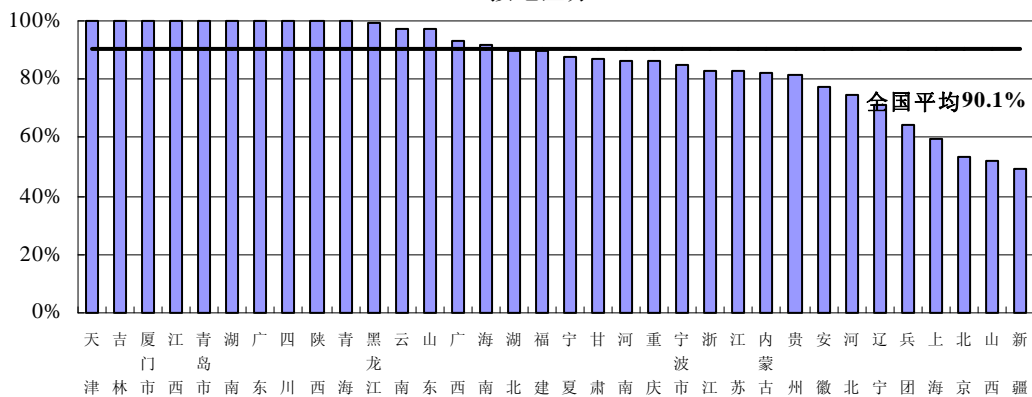

三、项目开工情况

2012 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 16830 个，其中中央预算内水利建设投资计划 6082 个，中央财政水利专项资金 10748 个。共有 15286 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 5411 个，中央财政水利专项资金开工

图4 2012年中央财政水利专项投资完成率
(按地区分)

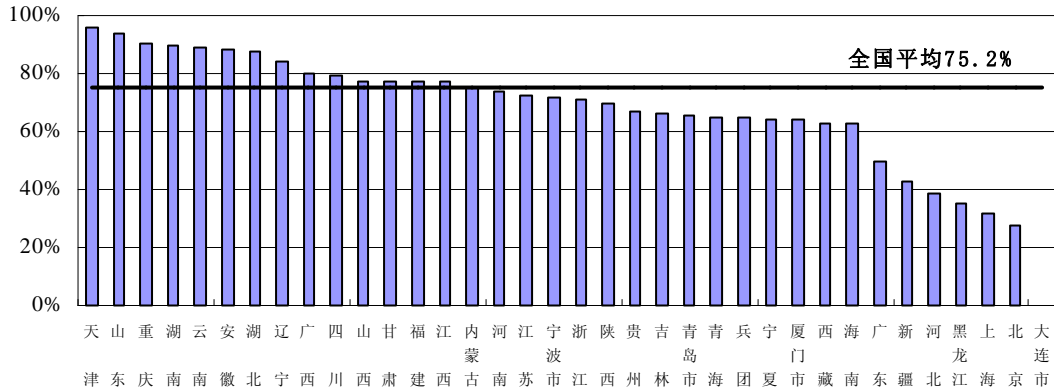

五、工程进展情况

2012年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 16.8 亿立方米，石方 3.2 亿立方米，砼 2718.9 万立方米，金属结构 42.7 万吨。累计新建及加固堤防长度 5344 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 5548 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 12489 公里，累计治理水土流失面积 4194 平方公里。

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份
